


# 月間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所


[平成31年3月1日～平成31年3月31日]

2月末予定進捗率 92%

2月末進捗率 91%



工事種類	2019年(平成31年)																												備考														
	2月				3月																									4月													
	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4			
仮設工事																																											
①S51年焼却施設					基礎・地中梁、ピット躯体解体、分別、コンクリートガラ小割																																						
					煙突基礎解体、分別、コンクリートガラ小割																																						
基礎杭撤去工事					S51年焼却施設(煙突含む)																																						
外構他					北側フェンス・基礎、構築物撤去																																						
																													南側擁壁、構築物撤去														
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃ブラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出																																									
	特管物																																										
搬出入車両台数	～10台				～20台																								～10台														
行事他					特安																				店社				松戸市 検査 定例 防災				特安										

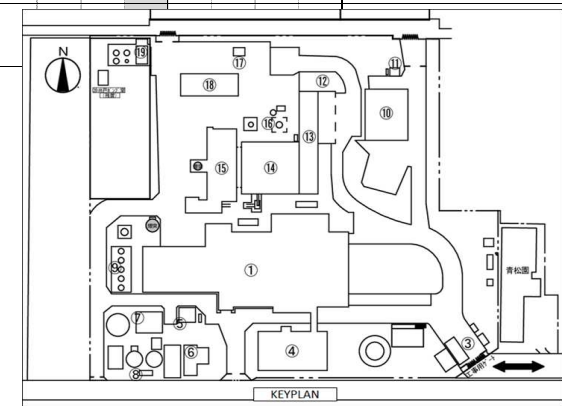

※行事凡例 定会:定例会議 防災:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼 店社:店社/パトロール
