



# 月間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業㈱ 松戸六和CC解体作業所

[平成29年12月1日～平成29年12月31日]

11月末予定進捗率 3.4%  
 11月末進捗率 1.7%

工事種類	2017年(平成29年)																															2018年(平成30年)				備考		
	11月				12月																											1月						
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		1	2
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
仮設工事	建柱・キュービクル設置				各所配線工事							受電・配線工事				電源切替(停電作業)																						
												既設高圧引込み廃止(14:00)																										
先行解体工事					解体																																	
重油・灯油タンク					解体																					14:00消防立会												
③計量棟												※正門通行止め																										
④管理棟												上屋解体																										
⑨薬品タンク置場												※安全通路設置																										
⑩粉碎機処理前室												渡り廊下解体																										
⑬給水ポンプ室												内外装材・タンク撤去																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
⑬給水ポンプ室												内外装材撤去																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
⑬給水ポンプ室												内外装材撤去																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
⑬給水ポンプ室												上屋解体																										
①S51年焼却炉棟	ピット内残置ごみ片付け				撤出																								年末年始休暇									
												アスベスト除去用足場組立(1工区→2工区)																										
												養生設置(1工区→2工区)																										
												アスベスト除去(1工区→2工区)																										
環境アセス調査(別途)	騒音・振動調査				大気質調査																																	
行事他	防災 15:00				特安																								防災 15:00									

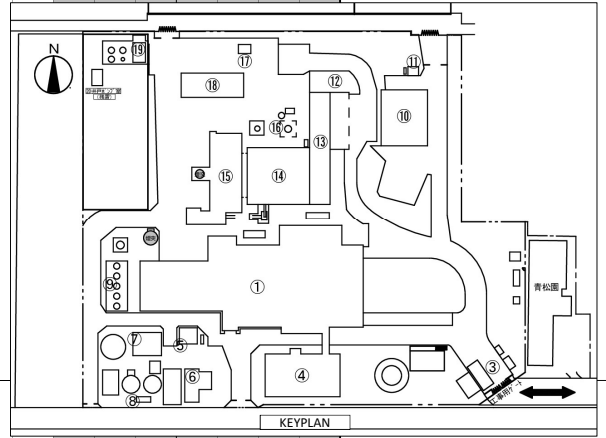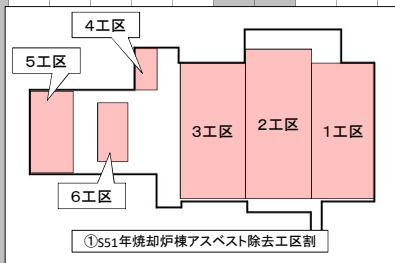

※行事凡例 定会:定例会議 防災:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼
