

月間工程表



工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年1月1日～平成30年1月31日]

12月末予定進捗率 6%

12月末進捗率 4.5%

工事種類	2017年(平成29年)			2018年(平成30年)																												備考									
	12月			1月																								2月													
	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日		29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日		
①S51年焼却炉棟																																									アスベスト除去用棚足組立(5工区→3工区→6工区→4工区)、棚足場解体(2工区→1工区→5工区→3工区→6工区→4工区) アスベスト除去用養生(5工区→3工区→6工区→4工区)、養生撤去(5工区→3工区→6工区→4工区) 養生完了検査予定 アスベスト除去(5工区→3工区→6工区→4工区)
⑬⑭⑮S41年焼却炉棟																																								ダイオキシン除染準備工事	
③計量棟																																								台貫撤去	
⑫粉碎機室																																								露出部機械解体	
外部構造物																																								S51年焼却炉南側スロープ一部解体	
廃棄物搬出	産業廃棄物																																							廃プラ、木、スクラップ材搬出	
	特管物																																							アスベスト除去材搬出(廃石綿)	
汚染土壌搬出																																								環境基準値以上ダイオキシン汚染土搬出 環境基準値以下ダイオキシン汚染土集積→搬出	
行事他																																								特安 防災 14:00 特安	

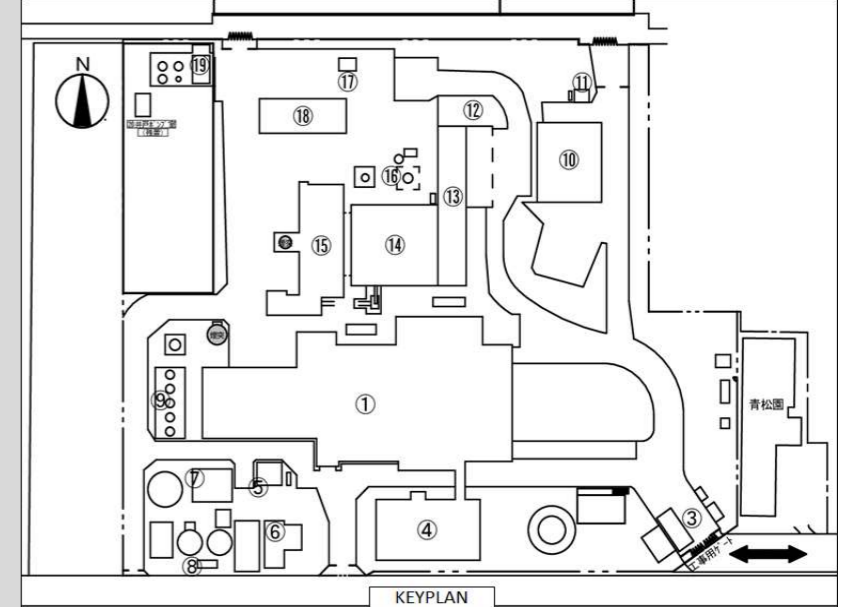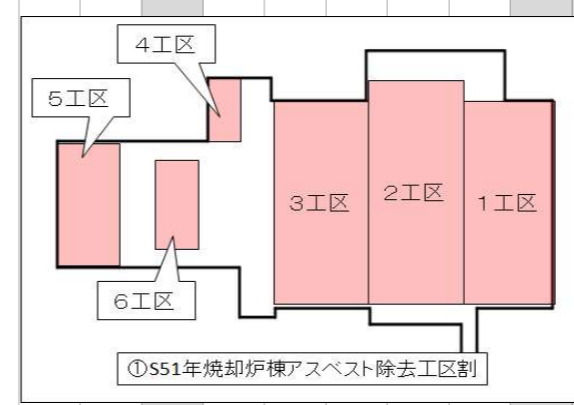

※行事凡例 定会:定例会議 防災:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼
