


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年2月5日～平成30年2月10日]

工事種類	2月							備考
	5月	6火	7水	8木	9金	10土	11日	
仮設工事				⑩粉碎機前処理室ピット埋戻し→整地				
⑫粉碎機室		内部機械解体・撤去						
⑬⑭⑮S41年焼却施設		ダイオキシン類除染養生用足場組立、屋根トラス材設置						
		ダイオキシン類除染養生工事						
①S51年焼却施設		ダイオキシン類除染排水処理プラント搬入・設置						
		ダイオキシン類除染水流出防止工事						
汚染土壌工事		内部片付け、配線撤去						
		環境基準値以下ダイオキシン汚染土掘削→フレコンバック詰め						
産業廃棄物搬出		環境基準値以上ダイオキシン類汚染土搬出 ※1日1台						
	産業廃棄物	石綿含有廃棄物搬出(非飛散型) ※1日1台						
特管物		廃プラ、コンガラ、木、スクラップ他搬出						
	特管物		アスベスト除去材搬出(1台)		アスベスト除去材搬出(1台)			
別途工事								
行事他								

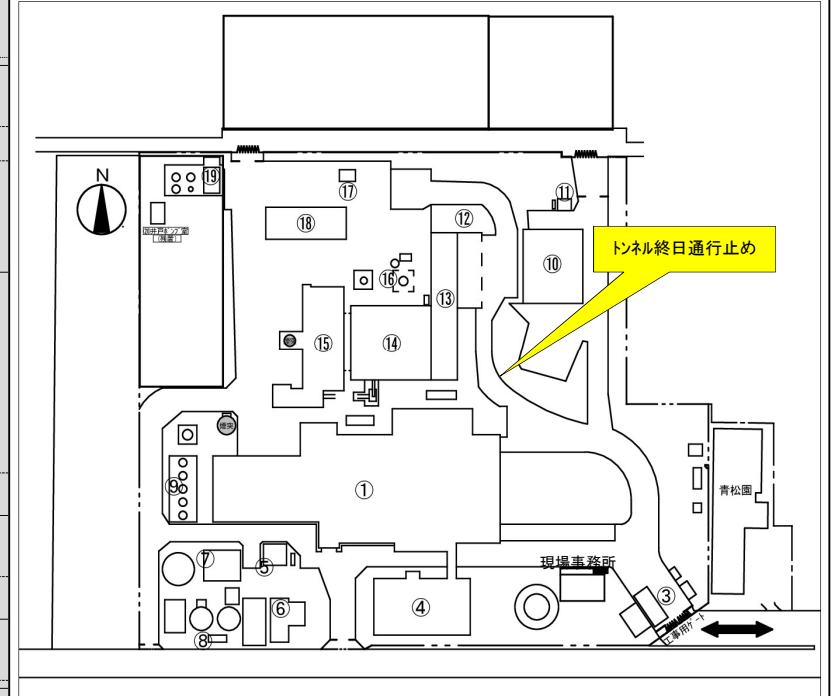

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理室	⑲油倉庫
