

# 月間工程表



工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年4月1日～平成30年4月30日]

3月末予定進捗率 23%

3月末進捗率 26%

| 工事種類  |                      | 2018年(平成30年)                 |    |    |                   |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    | 備考 |    |    |   |   |   |   |
|---|----------------------|------------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|---|---|------|-----------|-----------------|---|------|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----------|----|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
|   |                      | 3月                           |    |    | 4月                |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    | 5月 |    |   |   |   |   |
|   |                      | 29                           | 30 | 31 | 1                 | 2      | 3      | 4 | 5 | 6    | 7         | 8               | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20     | 21 | 22 | 23       | 24 | 25       | 26 | 27 | 28 |    | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 木   | 金                    | 土                            | 日  | 月  | 火                 | 水      | 木      | 金 | 土 | 日    | 月         | 火               | 水 | 木    | 金  | 土  | 日  | 月               | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日      | 月  | 火  | 水        | 木  | 金        | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金 | 土 | 日 |   |
| 仮設工事  |                      |                              |    |    |                   |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
| ①<br>S<br>5<br>1<br>年<br>焼<br>却<br>炉<br>棟           | ダイオキシン類除染工事          | ダイオキシン類除染準備工事                |    |    | ダイオキシン類除染(灰だし、洗浄) |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|   | アスベスト除去工事            | 7工区                          | 養生 |    |                   |        | 養生完了検査 |   |   |      | 石綿除去→養生撤去 |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    | 養生足場解体 |    |    |          |    | 石綿除去完了検査 |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
| ⑦<br>排水処理電気室<br>(アスベスト除去工事)                         | 8工区                  | 養生                           |    |    |                   | 養生完了検査 |        |   |   | 石綿除去 |           |                 |   | 養生撤去 |    |    |    | 石綿除去完了検査(養生撤去前) |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
| ⑬<br>⑭<br>⑮<br>S<br>4<br>1<br>年<br>焼<br>却<br>炉<br>棟 | 設備解体工事               | 設備解体・搬出                      |    |    |                   |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|   | 産業廃棄物                | 廃プラ、コンガラ、木、スクラップ、ばいじん、燃え殻他搬出 |    |    |                   |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
| 廃棄物搬出   | 特管物                  | ばいじん、燃え殻(ダイオキシン類)            |    |    |                   |        |        |   |   |      |           | アスベスト除去材搬出(廃石綿) |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
| 汚染土壌搬出  | 環境基準値以下ダイオキシン類汚染土壌搬出 |                              |    |    |                   |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    |          |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
| 行事他   | 特安                   |                              |    |    |                   |        |        |   |   |      |           |                 |   |      |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |        |    |    | 防災 14:00 |    |          |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |

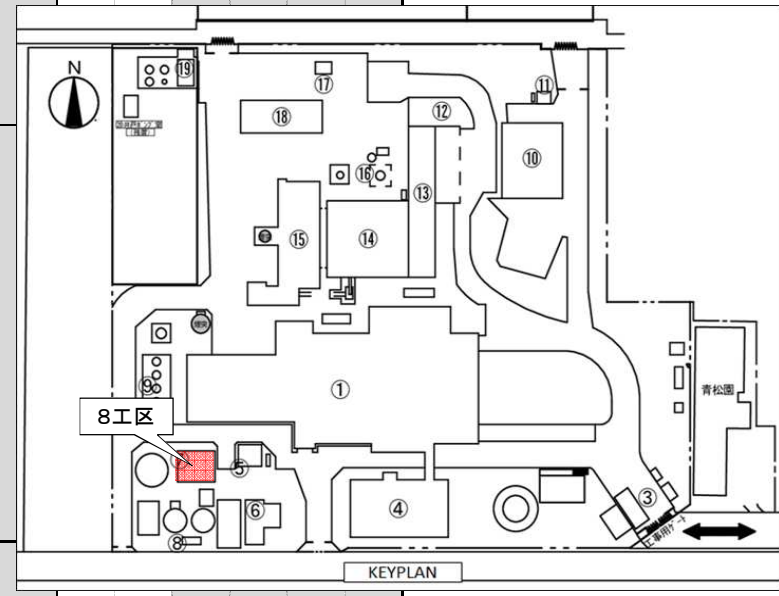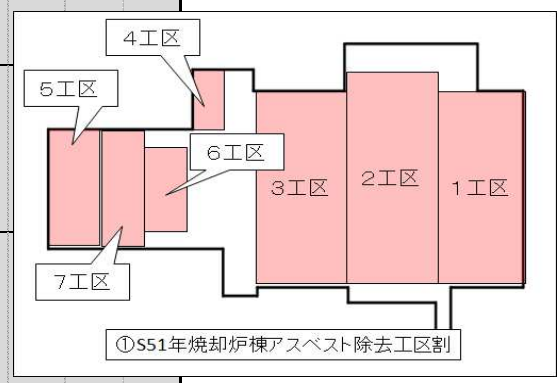

※行事凡例 定会:定例会議 防災:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼
