

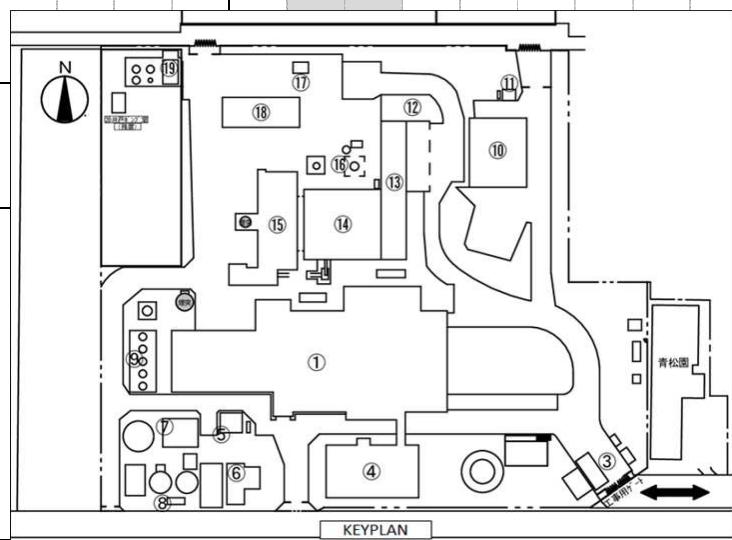
# 月間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年6月1日~平成30年6月30日]

5月末予定進捗率 39%

5月末進捗率 42%

工事種類	2018年(平成30年)																															備考															
	5月				6月																												7月														
	28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水		28 木	29 金	30 土	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木							
仮設工事																																															
① S 5 1 年 焼 却 炉 棟	仮設工事																																														
	ダイオキシン類除染工事	休工																																													
	煙突解体工事																																														
	内部解体工事																																														
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他										区画密閉養生足場組立→シート張→ダイオキシン類除染準備工事								ダイオキシン類除染																													
⑬ ⑭ ⑮ S 4 1 年 焼 却 炉 棟	仮設工事																																														
	内部解体工事									設備解体・搬出								屋根スレト材撤去																													
	煙突解体工事																																														
	建屋解体工事																																														
廃棄物搬出	産業廃棄物									廃プラ、木、スクラップ、汚泥、コンガラ、ばいじん・燃え殻他搬出																																					
	特管物																																														
特殊車両搬出入																																															
行事他					災防 13:00			特安																																店社 8:00		災防 14:00		店社 14:00		特安	全国安全週間(7/1~7/7)

※行事凡例 定会:定例会議 災防:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼 店社:店社パトロール
