

月間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年8月1日～平成30年8月31日]

7月末予定進捗率 55%

7月末進捗率 55%

工事種類	2018年(平成30年)																																備考																																		
	7月				8月																													9月																																	
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	1	2	3	4																											
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																													
仮設工事					洗浄水処理設備解体・搬出																																																														
① S 5 1 年 焼 却 炉 棟	仮設工事				前室足場組立→シート養生																																																														
	内部解体工事				準備工事																																																														
	ダイオキシン類除染工事				煙突内部除染完了確認検査																																																														
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他					設備・上屋解体搬出																																																														
⑬ ⑭ ⑮ S 4 1 年 焼 却 炉 棟	仮設工事																																																																		
	建屋解体工事				建屋解体																																																														
廃棄物搬出	産業廃棄物																																																																		
	特管物				ダイオキシン類含有汚泥搬出																																																														
特殊車両搬出入																																																																			
行事他					夏季休暇																																																														
					特安																																																														
					定例 店社																																																														
					炎防 14:00																																																														
					特安																																																														

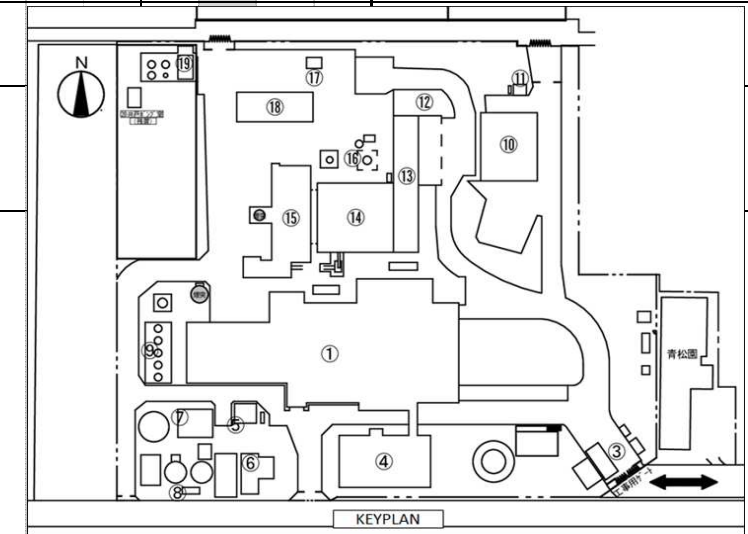

※行事凡例 定会:定例会議 炎防:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼 店社:店社バナー
