

月間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年10月1日～平成30年10月31日]

9月末予定進捗率 69%

9月末進捗率 66%

工事種類	2018年(平成30年)																															備考						
	9月				10月																												11月					
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	1	2
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事																																						
① S51年焼却炉棟	仮設工事	解体養生足場組立→養生シート張 ふっ素汚染土深度調査、地下水位調査 区画密閉養生撤去、足場解体																																				
	内部解体工事	設備解体・分別、片付け 設備解体完了立会検査 建屋解体・分別																																				
④管理棟	外部足場組立→アスベスト除去養生設置 養生完了立会検査 外壁アスベスト除去																																					
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他	試験、基礎・ピット躯体解体、小割																																					
⑩粉碎機前処理棟	基礎・ピット躯体解体、小割																																					
⑬⑭⑮S41年焼却炉棟	コンガラ小割																																					
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃ブラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出																																				
	特管物																																					
植栽移植	植栽移植、灌水養生																																					
外構	S51年焼却施設東側アスファルト舗装・盛土撤去																																					
搬出入車両台数	~10台 ~30台																																					
行事他	特安 店社 店社 定例 災防 14:00 特安																																					

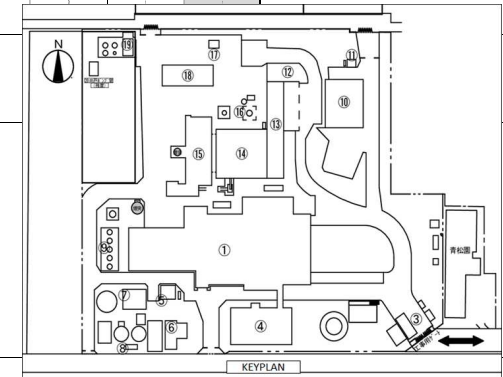

※行事凡例 定会：定例会議 災防：災害防止協議会 特安：特別安全朝礼 店社：店社/各ロール
