

月間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[令和元年5月1日～令和元年5月31日]

4月末予定進捗率 98%

4月末進捗率 98%

工事種類	2019年																															備考																						
	4月						5月																										6月																					
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4												
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火														
仮設工事																																																						
外構・整地																																																						
仮設道路																																																						
その他																																																						
廃棄物搬出	産業廃棄物																																																					
	特管物																																																					
搬出入車両台数																																																						
行事他	定例																																																					

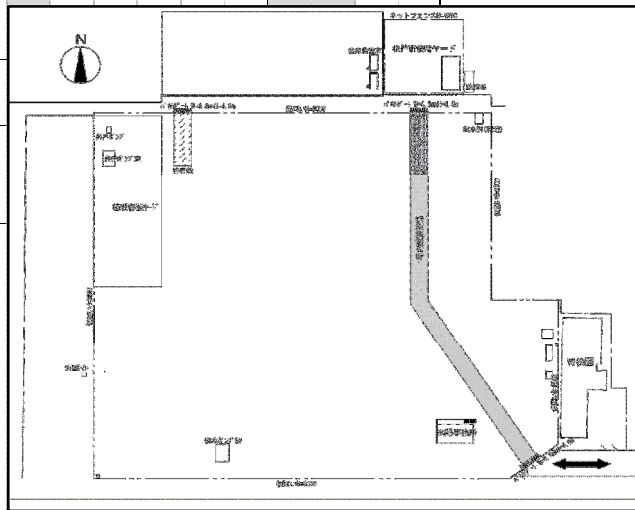

GW休暇

※行事凡例 定会:定例会議 災防:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼 店社:店社/ホール
