


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年2月19日～平成30年2月23日]



工事種類	2月							備考	
	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日		
仮設工事									
⑨薬品タンク基礎			薬品タンク・灯油タンク基礎立上り解体						
⑫粉碎機室	内部機械、建屋解体								
⑬⑭⑮S41年焼却施設	前室足場組立、屋根トラス材設置、シート養生								
	ダイオキシン類除染準備工事		ダイオキシン類除染工事						
	焼却設備側養生完了立会検査								
①S51年焼却施設	ダイオキシン類除染水流出防止工事								
	内部片付け、配線撤去								
汚染土工事	環境基準値以下ダイオキシン汚染土掘削→フレコンバック詰め								
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、コンガラ、木、スクラップ他搬出							
	特管物	S51年焼却施設内残水搬出							
行事他									

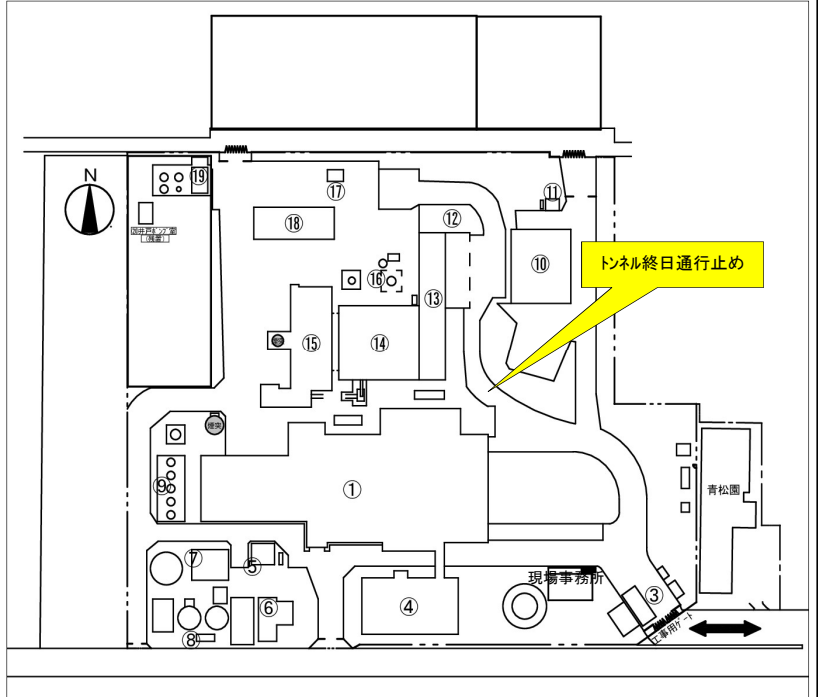

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理室	⑲油倉庫
