

週間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年7月17日～平成30年7月20日]



工事種類	16	17	18	7月	20	21	22
	月	火	水	19 木	金	土	日
仮設工事				220tラフタークレーン解体			
⑬⑭⑮S41年焼却施設		区画密閉養生撤去、屋根下地、足場解体 煙突上部鋼製部撤去部足場解体 煙突上部鋼製部解体・撤去					
①S51年焼却施設			煙突内部耐火レンガ撤去→洗浄				
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		区画密閉養生撤去、屋根下地、足場解体					
外部			片付け、通路整備				
産業廃棄物		廃ブラ、木、スクラップ、汚泥、がれき類他搬出					
特管物							
特殊車両搬出入				220tラフタークレーン搬出(21:00～)			
行事他				店社パトロール	店社パトロール		

備考

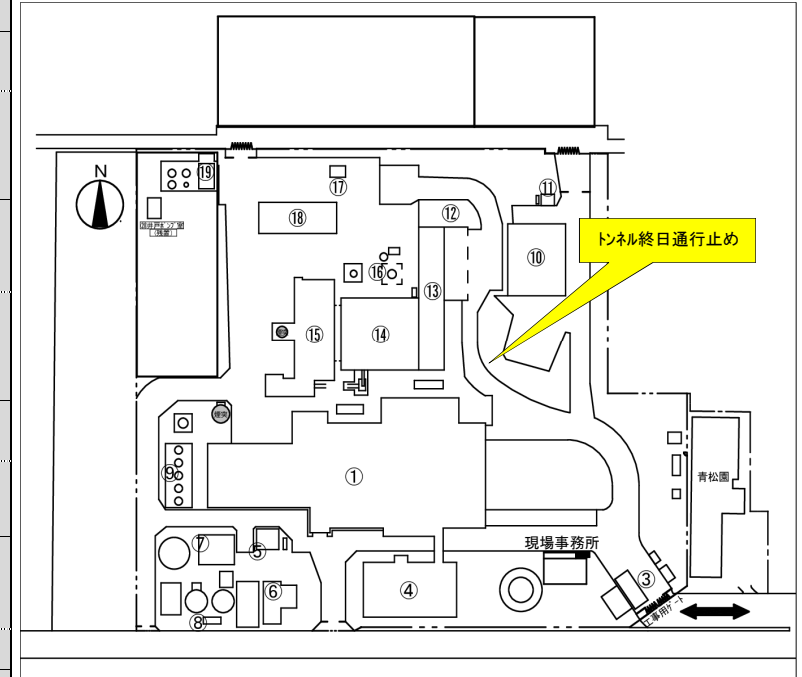

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫
