


調査結果:作業中(管理棟2工区)

石綿粉じん濃度測定位置図

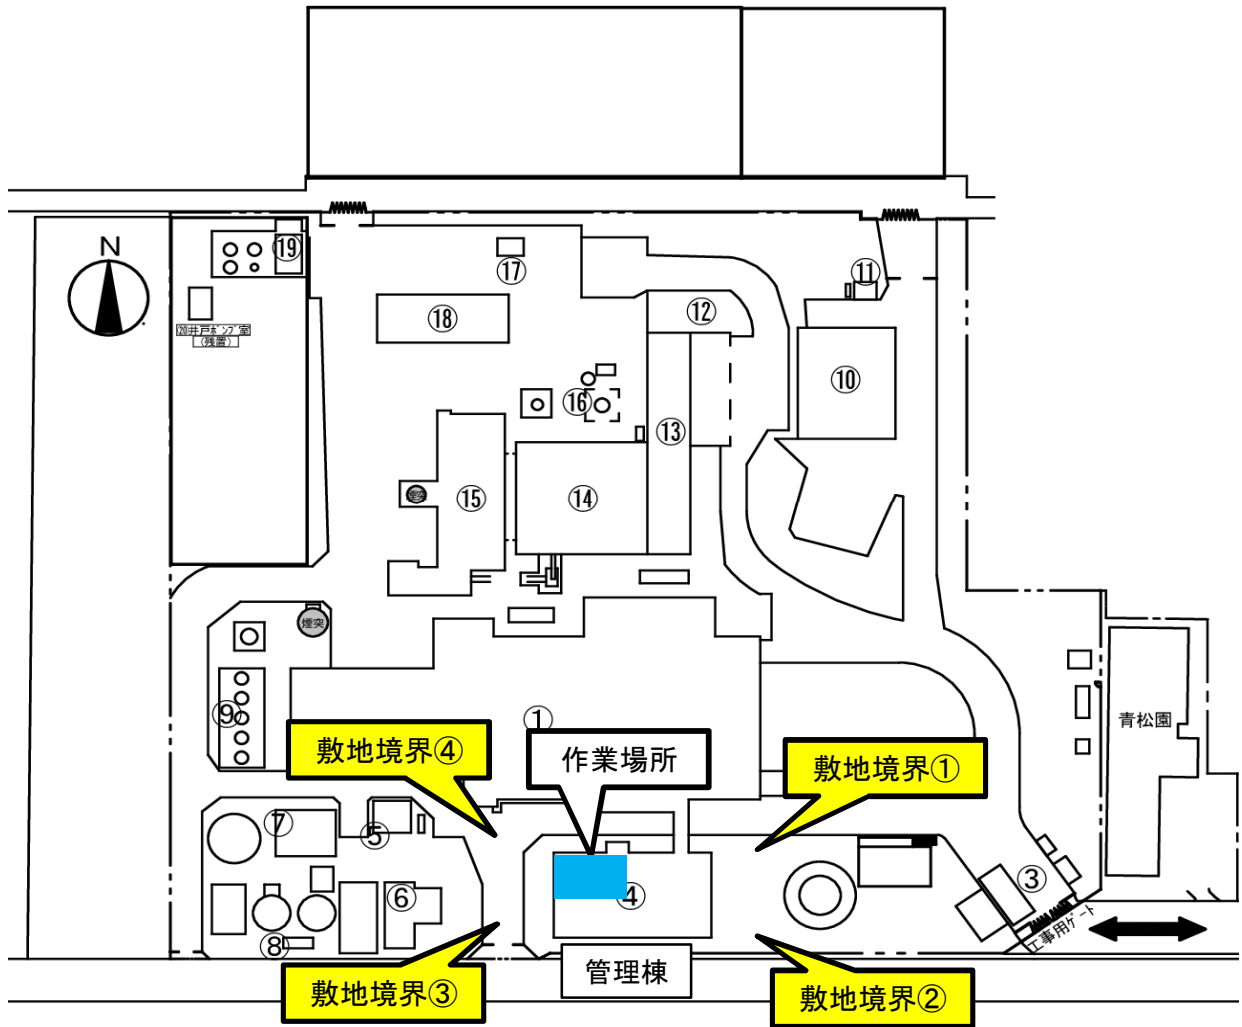

石綿粉じん濃度測定結果

No	段階	採取日	場所	試料採取量(L)	結果(f/L)	判定基準	判定
1	作業中 (管理棟2工区)	11月15日	敷地境界①	2400	0.2未満	10f/L	異常なし
2			敷地境界②	2400	0.2未満	10f/L	異常なし
3			敷地境界③	2400	0.2未満	10f/L	異常なし
4			敷地境界④	2400	0.2未満	10f/L	異常なし
5			セキュリティゾーン	600	0.5未満	10f/L	異常なし
6			負圧排気口	600	0.5未満	10f/L	異常なし
7	養生撤去前	11月17日	作業場内	600	0.5未満	10f/L	異常なし
