月 間 工 程 表

［令和元年6月1日～令和元年6月30日］

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱ 松戸六和CC解体作業所

5月末予定進捗率 99%
5月末進捗率 99%

工事種類	2019年 5月						6月																									7月				備　考
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
仮設工事																														仮設電気他撤去			仮設コンテナハウス搬出	敷鉄板搬出							
諸検査他										書類作成						社内完了検査	監理完了検査								松戸市完了検査																
廃棄物搬出 産業廃棄物																																									
廃棄物搬出 特管物																																									
搬出入車両台数																																～3台									
行事他																																									

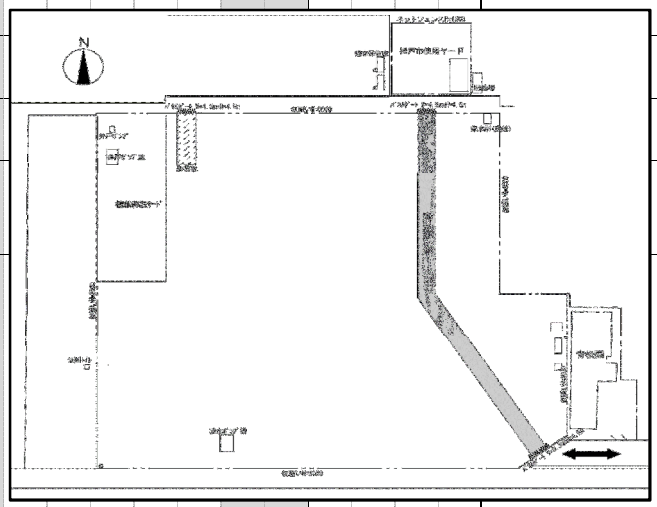

※行事凡例　定会：定例会議　災防：災害防止協議会　特安：特別安全朝礼　店社：店社パトロール
