月 間 工 程 表

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱ 松戸六和CC解体作業所

［平成29年11月1日～平成29年11月30日］

10月末予定進捗率 0%
10月末進捗率 0%

工事種類	10月 28 土	29 日	30 月	31 火	11月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	12月 1 金	2 土	3 日	4 月	備　考
仮設工事 仮設事務所工事										事務所ヤード整備				事務所建方			仮設電気･設備工事																						
																	備品搬入																						
仮設工事 仮囲い工事			敷地境界等調査														仮囲い設置（東面→北面→西面→南面）																						
																	枝払い･片付け																						
仮設工事 建屋内部危険箇所対策																	⑬⑭⑮S41年焼却炉内柵･手摺設置、昇降用階段設置																						
仮設工事 既存池鯉移動																	鯉移動																						
先行解体工事																																	③⑨⑩⑪⑯⑲内装、外装解体					
行事他	住民説明会		定例 13:30		災防 14:00			住民説明会																								災防 14:00			特安				

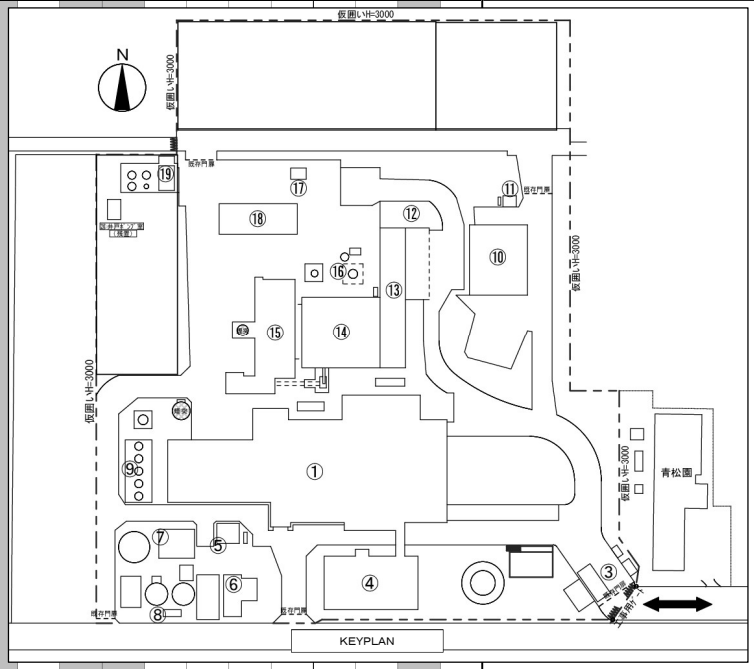

※行事凡例　定会:定例会議　災防:災害防止協議会　特安:特別安全朝礼
