月 間 工 程 表

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱ 松戸六和CC解体作業所

［平成30年3月1日～平成30年3月31日］

2月末予定進捗率 19%
2月末進捗率 17%

工事種類		2018年(平成30年) 2月 26 月	27 火	28 水	3月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	4月 1 日	2 月	3 火	備　考
仮設工事																																							
①S51年焼却炉棟	ダイオキシン類除染工事	養生用足場、屋根トラス・屋根下地組立→区画シート養生、クリーンルーム設置																												煙突内ダイオキシン類除染(灰だし、洗浄)										
	吹付アスベスト除去																							7工区		足場組立、養生											アスベスト除去		
⑫粉砕機室		建屋解体(一部S41年焼却施設含む)→通路整備																																					
⑬⑭⑮S41年焼却炉棟	ダイオキシン類除染工事	前室まわり区画シート養生																																					
									ダイオキシン類除染(灰だし、洗浄)																													
	設備解体																													設備解体									
廃棄物搬出	産業廃棄物								アスベスト含有産業廃棄物搬出(非飛散型) ※1日1台搬出																														
		廃プラ、コンガラ、木、スクラップ、汚泥他搬出																																					
	特管物																										ばいじん・燃え殻搬出(ダイオキシン類含有)													
									アスベスト除去材搬出(廃石綿)					※2月からの予定変更																									
汚染土壌工事		基準値以下ダイオキシン汚染掘削→集積																																					
行事他			災防 14:00		特安							店社パトロール												店社パトロール							災防 14:00						特安		

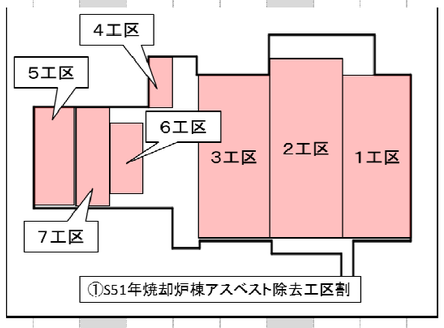

①S51年焼却炉棟アスベスト除去工区割

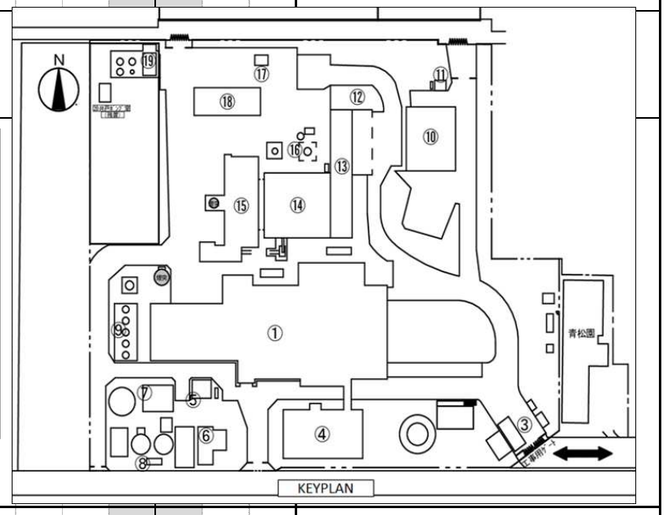

※行事凡例　定会：定例会議　災防：災害防止協議会　特安：特別安全朝礼
