月 間 工 程 表

［平成30年5月1日～平成30年5月31日］

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱　松戸六和CC解体作業所

4月末予定進捗率　31%
4月末進捗率　34.5%

工事種類	2018年(平成30年) 4月					5月																											6月			備　考
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
仮設工事																																								
①S51年焼却炉棟 ダイオキシン類除染工事	設備内灰出し・洗浄、建屋内洗浄																		煙突内一次洗浄												煙突内耐火材、耐火レンガ撤去											
																						ゴンドラ設置用開口				ゴンドラ設置																
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他						ダイオキシン類除染洗浄水流出防止工事																				区画密閉養生足場組立→シート張																
⑬⑭⑮S41年焼却炉棟 設備解体工事												設備解体・搬出																												
廃棄物搬出 産業廃棄物																		廃プラ、木、スクラップ、汚泥他搬出																						
廃棄物搬出 特管物																																								
行事他						特安								店社															店社						災防 14:00						

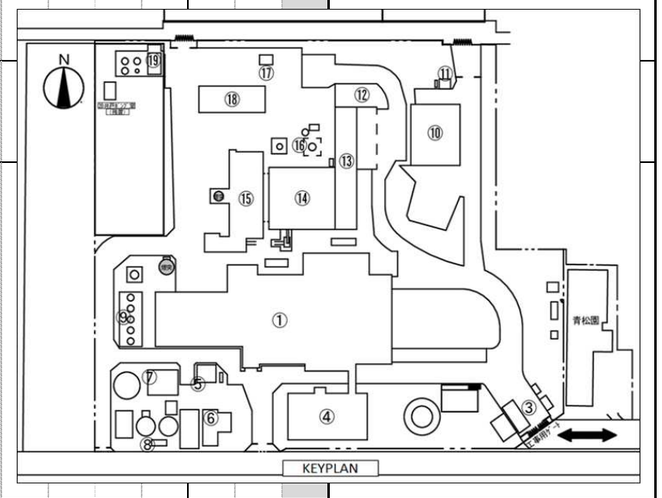

※行事凡例　定会：定例会議　災防：災害防止協議会　特安：特別安全朝礼　店社：店社パトロール
