月 間 工 程 表

[平成30年7月1日～平成30年7月31日]

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　前田建設工業㈱ 松戸六和CC解体作業所

6月末予定進捗率 47%
6月末進捗率 47%

2018年(平成30年)

工事種類		工程	備考
仮設工事		220tラフタークレーン組立 220tラフタークレーン解体	
①S51年焼却炉棟	仮設工事	煙突撤去用足場整備 煙突内部ゴンドラ撤去・搬出 煙突足場解体・盛替え 煙突内部ゴンドラ設置 前室組立、シート養生 煙突内部ゴンドラ解体・搬出	
	ダイオキシン類除染工事	焼却施設ダイオキシン類除染完了検査 煙突内部耐火レンガ撤去・洗浄→RC部分2次洗浄	
	煙突解体工事	準備工事 上部鋼製部分撤去	
	内部解体工事		
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		区画密閉養生撤去、足場解体 ダイオキシン類除染 設備・上屋解体、搬出 ダイオキシン類除染完了検査 ピットまわり試掘調査	
⑬⑭⑮S41年焼却炉棟	仮設工事	区画密閉養生撤去、足場解体	
	内部解体工事	設備解体・搬出、片付け	
	煙突解体工事	準備工事 上部鋼製部分撤去	
	建屋解体工事	建屋解体	
廃棄物搬出	産業廃棄物	非飛散型アスベスト含有産業廃棄物搬出 ※1日1台搬出 廃プラ、木、スクラップ、ばいじん・燃え殻、がれき類他搬出	
	特管物	汚泥搬出	
特殊車両搬出入		220tラフタークレーン搬入(～AM6:00) 220tラフタークレーン搬出(PM9:00)	

行事他	6月28日(木)	7月2日(月)	7月18日(水)	7月19日(木)	7月25日(水)	8月1日(水)	備考
	店社	特安	店社	店社	災防 14:00	特安	全国安全週間(7／1～7／7)

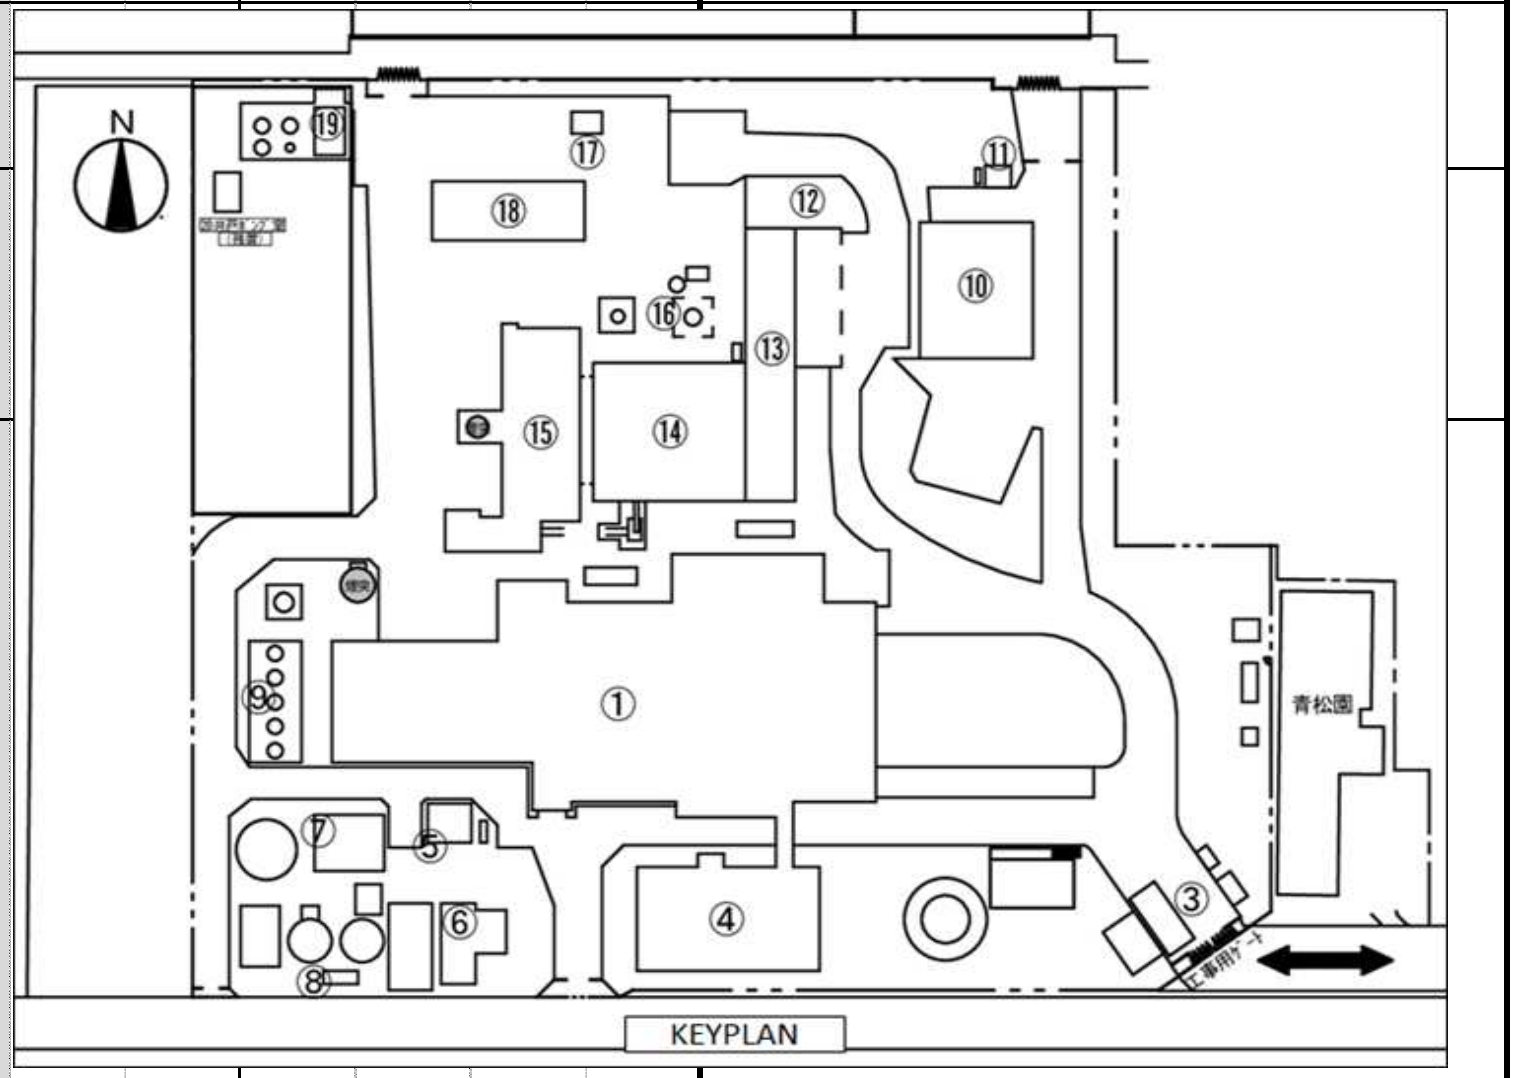※行事凡例　定会：定例会議　災防：災害防止協議会　特安：特別安全朝礼　店社：店社パトロール
