月 間 工 程 表

［平成30年12月1日～平成30年12月31日］

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱ 松戸六和CC解体作業所

11月末予定進捗率 76%
11月末進捗率 75%

工事種類	2018年(平成30年) 11月 27 火	28 水	29 木	30 金	12月 1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	2019年(平成31年) 1月 1 火	2 水	3 木	4 金	備　考
仮設工事																																							
①S51年焼却施設 仮設工事	南側山留シートパイル打設																																					
①S51年焼却施設 煙突撤去	解体、分別、コンクリートガラ小割																																					
①S51年焼却施設 基礎躯体解体							基礎・地中梁、ピット躯体解体、分別、コンクリートガラ小割																																
③計量棟												基礎躯体解体						基礎躯体解体							基礎躯体解体														
④管理棟							3工区アスベスト除去養生設置			養生完了立会検査				3工区アスベスト除去養生撤去																										
④管理棟										3工区アスベスト除去				除去完了立会検査																										
④管理棟														内装材解体・搬出																										
S41年焼却施設	煙突解体、分別、コンクリートガラ小割																																					
S41年焼却施設			煙突基礎解体、分別、コンクリートガラ小割																																			
基礎杭撤去工事																					S41年焼却施設→排水処理施設																		
廃棄物搬出 産業廃棄物															廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出																								
廃棄物搬出 特管物														廃石綿搬出																								
外構他																		植栽撤去																				
外構他																																						
土壌汚染対策工事																																						
土壌汚染対策工事																																						
土壌汚染対策工事																																						
搬出入車両台数														～20台																								
行事他		災防					特安																店社定例							災防								

年末・年始休暇
12/30～1/6

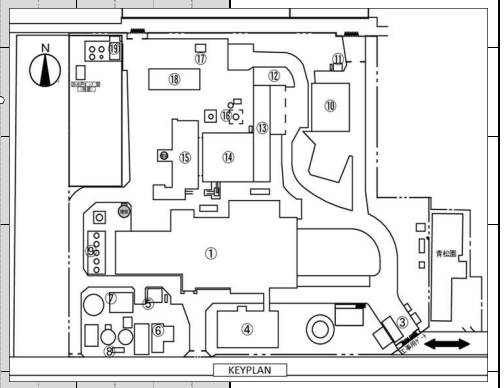

※行事凡例　定会：定例会議　災防：災害防止協議会　特安：特別安全朝礼　店社：店社パトロール
