# 月 間 工 程 表

[平成31年1月1日～平成31年1月31日]

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　　前田建設工業㈱　松戸六和CC解体作業所

12月末予定進捗率　82%
12月末進捗率　81%

| 工事種類 | 2018年(平成30年) 12月 | | | | | | | | | | | 2019年(平成31年) 1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 仮設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①S51年焼却施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎・地中梁、ピット躯体解体、分別、コンクリートガラ小割 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③計量棟 | | 基礎解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④管理棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 建屋解体、分別、コンクリートガラ小割 | | | | | | | 養生足場解体 | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎解体、分別、コンクリートガラ小割 | | | |
| | | | | | 内装材解体、搬出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎杭撤去工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 排水処理施設、S51年焼却施設、計量棟、薬品タンク置場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物搬出 産業廃棄物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃棄物搬出 特管物 | | | | PCB廃棄物搬出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構他 | 植栽移設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土壌汚染対策工事 | | | | | | 汚染土壌掘削、搬出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 年末・年始休暇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 搬出入車両台数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ～20台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事他 | | | | | | | 災防 | | | | | | | | | | | | | 特安 | | 店社 | | | | | | | | | 店社 | 定例 | | | | | | | 災防 | | | 特安 | | | |

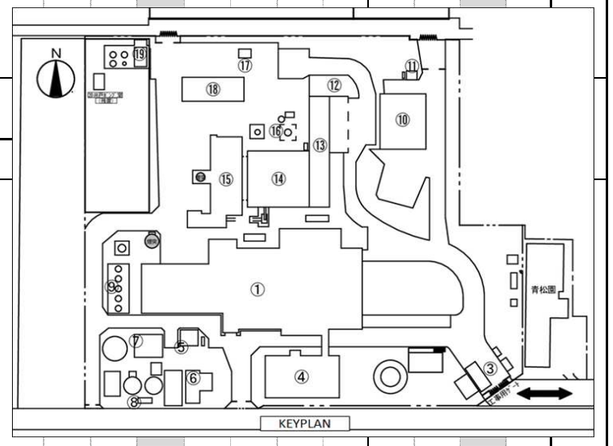


※行事凡例　定会：定例会議　災防：災害防止協議会　特安：特別安全朝礼　店社：店社パトロール
