月 間 工 程 表

[平成31年2月1日～平成31年2月28日]

工事名称　六和クリーンセンター解体工事
施　工　前田建設工業㈱ 松戸六和CC解体作業所

1月末予定進捗率　89%
1月末進捗率　88%

工事種類		2019年(平成31年)																																					備　考
		1月				2月																											3月						
		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
仮設工事																																									
①S51年焼却施設																	基礎･地中梁、ピット躯体解体、分別、コンクリートガラ小割																								
																																						煙突基礎解体			
④管理棟		解体材分別、コンクリートガラ小割																																							
基礎杭撤去工事							管理棟																																		
																		S51年焼却施設																							
廃棄物搬出	産業廃棄物																廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出																								
	特管物																																								
外構他																																									
汚染土壌対策工事	ふっ素汚染土壌		汚染土搬出																																						
		汚染土掘削、フレコン詰																																							
		掘削完了立会確認				地下水サンプﾘﾝｸﾞ					分析																														
	ダイオキシン類汚染土壌		採取資料分析																																						
											掘削、フレコン詰め										掘削面サンプル採取、分析																				
搬出入車両台数																		～20台																							
行事他						特安																		定例	店社						店社	災防		特安							

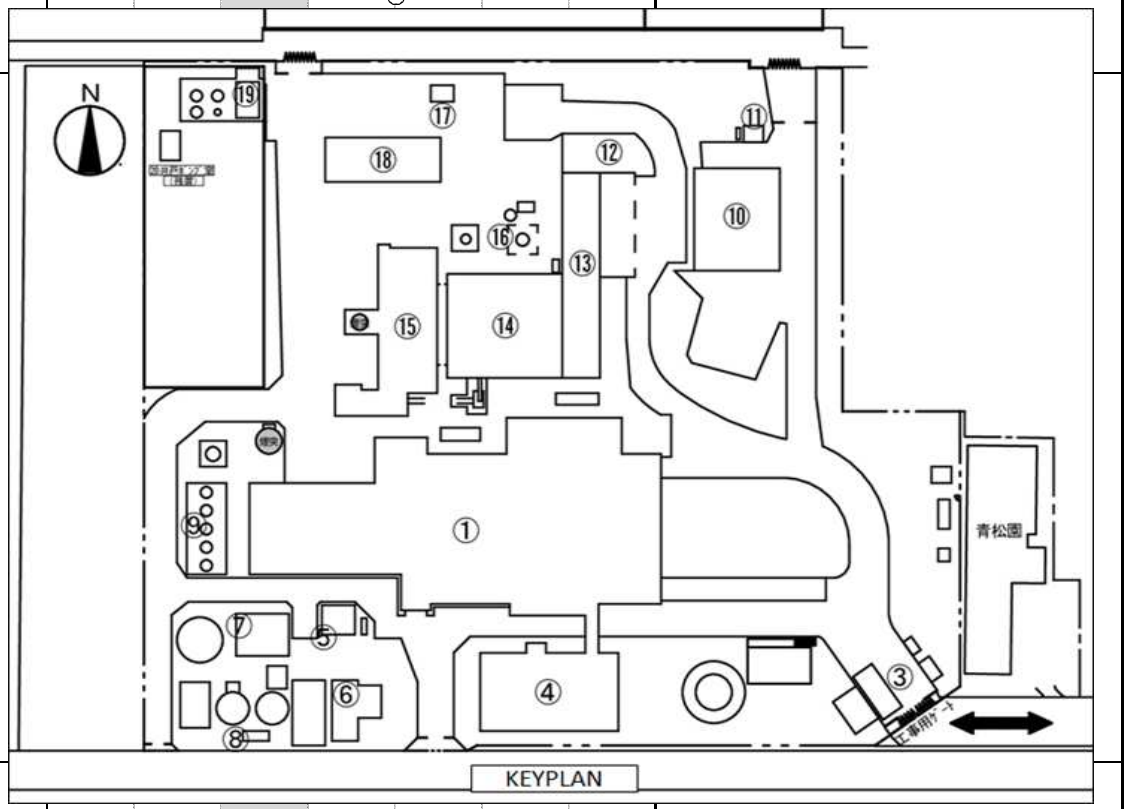

※行事凡例　定会：定例会議　災防：災害防止協議会　特安：特別安全朝礼　店社：店社パトロール
