


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年2月18日～平成31年2月23日]



工事種類	18	19	20	2月	22	23	24
	月	火	水	21 木	金	土	日
仮設工事							
①S51年焼却施設			基礎・ビット躯体解体、分別、コンガラ小割				
④管理棟	浄化槽解体・撤去						
基礎杭撤去工事		S51年焼却施設					
汚染土壌対策工事							
	ダイオキシン類汚染土壌	サンプル分析					
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
特殊車両搬出入							
外部工事		植栽伐採・伐根、外構構築物解体・撤去					
行事他		定例会議	店社パトロール				

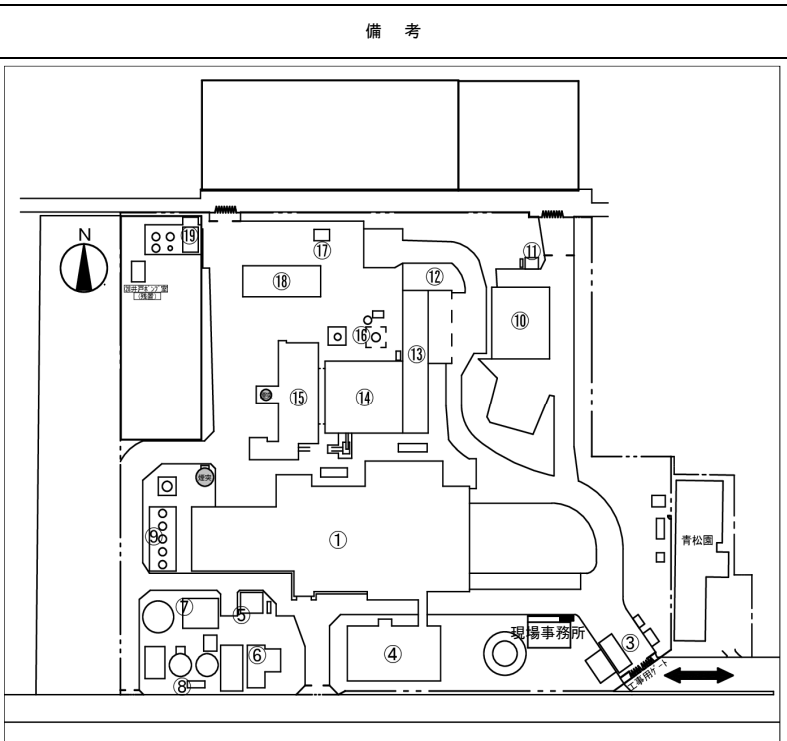

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミビット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫
