


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成31年4月1日～平成31年4月6日]



工事種類	4月						
	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日
仮設工事		○	南側仮囲い解体→再設置				
外構工事			解体材分別、コンガラ小割				
			舗装、構築物、埋設物撤去				
整地			整地・転圧				
			路盤作成				
場内仮設道路			路盤作成				
産業廃棄物 搬出	産業廃棄物		廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出				
	特管物						
特殊車両搬出入							
行事他			特別安全朝礼 店社バトロール				

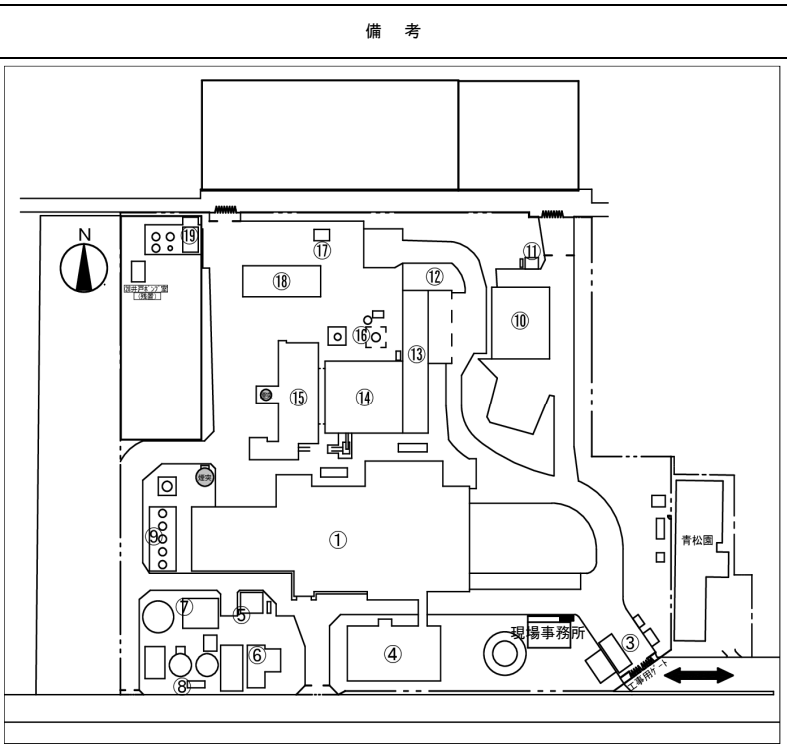

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫
