

週間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年5月1日～平成30年5月2日]



工事種類	4月	5月					
	30 月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設		設備解体					
①S51年焼却施設		ダイオキシン類除染(灰出し、洗浄)					
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		ダイオキシン類除染洗浄水流出防止準備工事					
				GW休暇 5/3～5/6			
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ他搬出					
	特管物						
行事他		特別安全朝礼					

備考

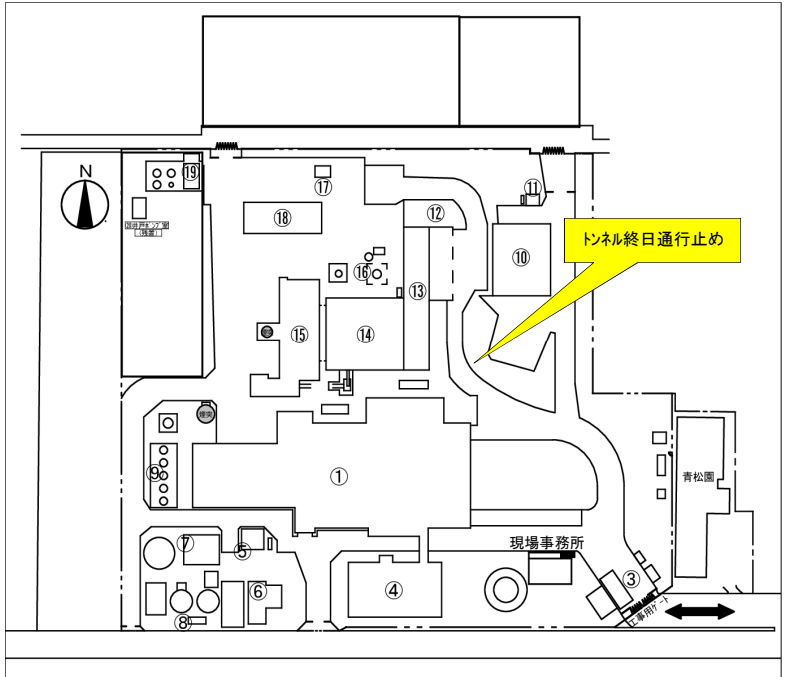

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫
