

週間工程表


工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年9月3日～平成30年9月8日]



工事種類	9月						
	3月	4火	5水	6木	7金	8土	9日
仮設工事							
⑬⑭⑮S41年焼却施設		ゴミピット解体、コンクリートガラ小割			ゴミピット解体完了立会検査		
①S51年焼却施設		設備解体・分別					
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		ピットまわり試掘調査		ピット・基礎躯体解体			
外部		片付け、整理					
産業廃棄物 特管物		廃ブラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
特殊車両搬出入							
行事他	特別安全朝礼						

備考

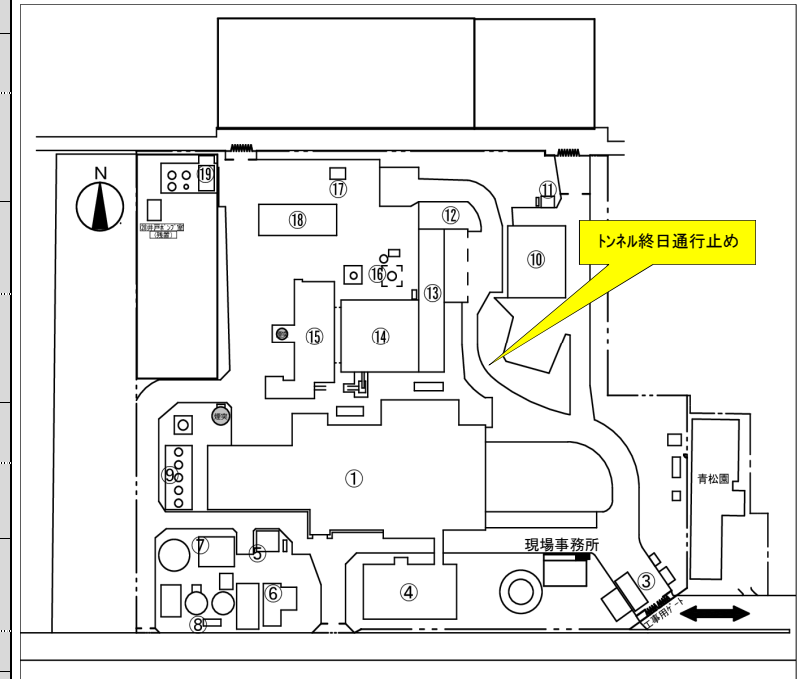

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫
